ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.239/2023 - I.P. 563/2023

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO

NOME ATTIVITA'	DURATA	SOGGETTO
ATTIVITA' PRELIMINARI		
ACCANTIERAMENTO - REALIZZAZIONE CESATA - SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE	3 gg	MANUTENTORE - DITTA EDILE
RIMOZIONE LINEE GAS A PAVIMENTO	1 gg	DITTA I. MECCANICI
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI	1 gg	DITTA I. MECCANICI - DITTA I. ELETTRICI
LINEE AREA PROVVISORIA SELF SERVICE	1 gg	DITTA I. ELETTRICI
FASE 1		
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIVESTIMENTI	5 gg	DITTA EDILE
RIMOZIONI LINEE ELETTRICHE		DITTA I. ELETTRICI
RIMOZIONE LINEE IDRICO-SANITARIE		DITTA I. MECCANICI
RIMOZIONI CANALIZZAZIONI ARIA NON NECESSARIE		DITTA I. MECCANICI
COSTRUZIONI NUOVI TAVOLATI		DITTA EDILE
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE		DITTA I. ELETTRICI
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS		DITTA I. MECCANICI
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO		DITTA I. MECCANICI
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIATNO ASPIRAZIONE (TORRINI IN COPERTURA)		
REALIZZAZIONE CARTONGESSI		DITTA EDILE
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO		DITTA EDILE
POSA NUOVO PAVIMENTO IN RESINA		DITTA EDILE
POSA RIVESTIMENTI		DITTA EDILE
TINTEGGIO		DITTA EDILE
RIMOZIONE CESATA		DITTA EDILE
RICOLLEGAMENTO ATTREZZATURE PRECEDENTEMENTE SPOSTATE	2gg	MANUTENTORE
COLLEGAMENTO NUOVE ATTREZZATURE - COLLAUDI	1 gg	FORNITORE
PULIZIE		CIRFOOD
FASE 2		
RIMOZIONE LINEE IMPIANTO ELETTRICO NON NECESSARIE		DITTA I. ELETTRICI
RIMOZIONE CANALI ARIA E POSA NUOVI CANALI		DITTA I. MECCANICI
REALIZZAZIONE VELETTA E STRUTTURA IN CARTONGESSO A COPERTURA CNALI ARIA		DITTA EDILE
POSA LAMA D'ARIA		DITTA I. ELETTRICI
MODIFICHE IMPIANTO ELETTICO		DITTA I. ELETTRICI
RIVESTIMENTO BLOCCO CANALI IN CARTONGESSO		DITTA EDILE
TINTEGGIO		DITTA EDILE
MONTAGGIO ISOLE FONOASSORBENTI		DITTA EDILE
RIMOZIONE LINEA SELF E INSTALALZIONE NUOVA LINEA SELF - COLLAUDI		FORNITORE
MONTAGGIO ELEMENTI IN ARREDO		ARREDATORE
PANNELLATURA LINEA SELF		ARREDATORE
MONTAGGIO TAVOLI E SEDIE		ARREDATORE
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ATRIO INGRESSO		DITTA EDILE
PULIZIE		CIRFOOD

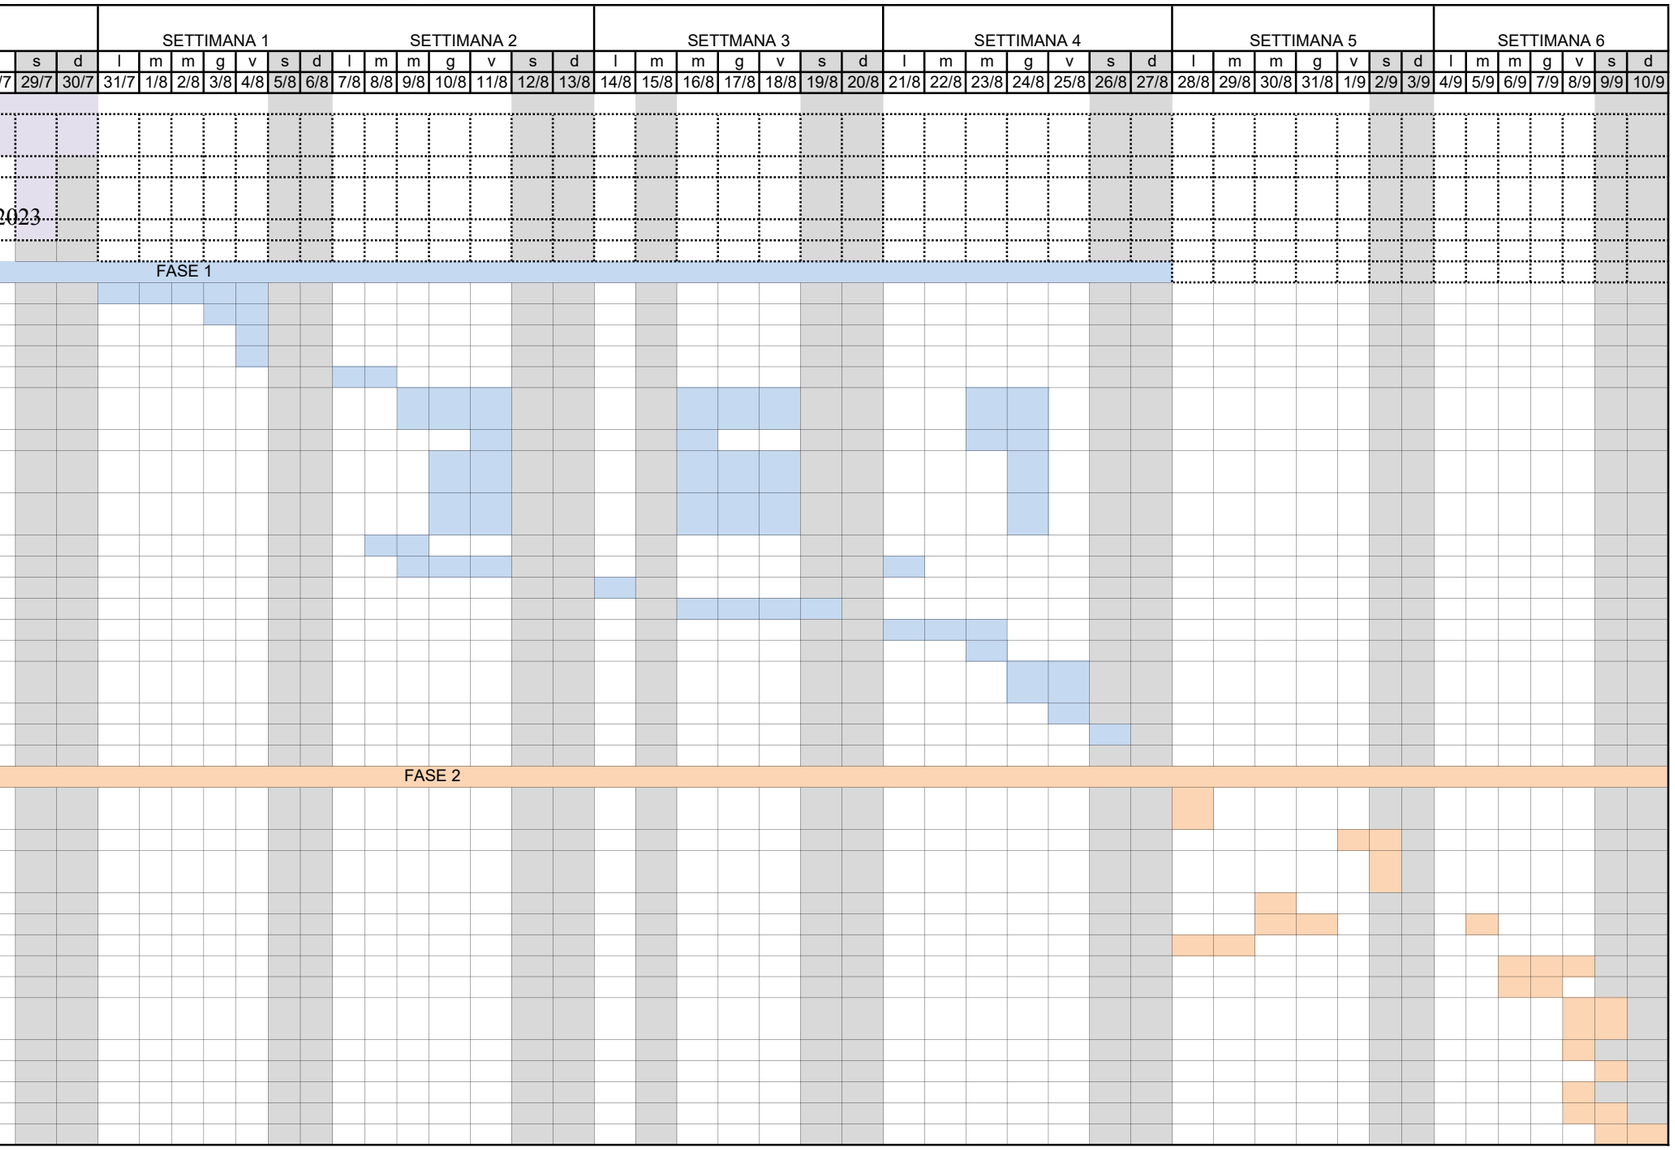

SI SPECIFICA CHE VERRA' VALUTATA LA FATTIBILITA' DI ANTICIPARE LA FASE 2 DI 1 SETTIMANA, SOVRAPPONENDO LE ATTIVITA' CON LA CONCLUSIONE DELLA FASE 1
